**KARLSSONS**
**Schakt & Transport**

| Projekt | | |
|---|---|---|
| Allmäna Åkerö Vo -15/11-24 | | |
| Utfärdad | Reviderad | Ansvarig |
| 2024-09-02 | 2024-11-15 | Rickard Karlsson |

Aktiviteter

| Aktivitet | Start | Bd |
|---|---|---|
| **Etablering** | **2024-08-10** | **20** |
| Material beställning | 2024-08-10 | 5 |
| Bodetablering | 2024-08-10 | 10 |
| Material leverans | 2024-08-31 | 5 |
| **Besitningar** | **2024-12-16** | **271** |
| Besiktning del 1 | 2024-12-16 | 5 |
| Slutbesiktning | 2026-02-28 | 5 |
| **Team 1** | **2024-09-09** | **322** |
| **Nybygårdsvägen** | **2024-09-09** | **50** |
| Huvudledning | 2024-09-09 | 30 |
| Stickvägar 1-4 | 2024-10-21 | 20 |
| **Djursnäsvägen** | **2024-11-18** | **98** |
| Huvudledning | 2024-11-18 | 54 |
| Stickvägar 5-10 | 2025-02-17 | 44 |
| **Djurnäsudde** | **2025-04-22** | **51** |
| Huvudledning | 2025-04-22 | 31 |
| Stickvägar 11-13 | 2025-06-09 | 20 |
| Provtryckning | 2024-12-09 | 13 |
| **Anslutningspukt 3** | **2025-08-02** | **20** |
| Huvudledning | 2025-08-02 | 15 |
| Stickvägar 1-3 | 2025-08-25 | 5 |
| **Anslutningspunkt 1** | **2025-09-01** | **15** |
| Huvudledning | 2025-09-01 | 12 |
| Provtryckning / Vattenprov | 2025-09-17 | 3 |
| **Åkerö Västergården västra** | **2025-09-22** | **58** |
| Huvudledning | 2025-09-22 | 48 |
| Stickvägar 1 | 2025-11-27 | 5 |
| Provtryckning / Vattenprov | 2025-12-04 | 5 |
| **Edsviksgläntan** | **2025-12-11** | **30** |
| Huvudledning | 2025-12-11 | 25 |
| Provtryckning / Vattenprov | 2026-02-03 | 5 |
| **Team 2** | **2024-09-09** | **336** |
| **Åkeröstigen** | **2024-09-09** | **55** |
| Huvudledning | 2024-09-09 | 30 |
| Stickvägar | 2024-10-21 | 15 |
| Inkoppling odomin mm | 2024-11-11 | 10 |
| **Åkeröbyväg östra 0-450** | **2024-11-11** | **40** |
| Huvudledning | 2024-11-11 | 25 |
| Stickvägar 1-2 | 2024-12-16 | 10 |
| Provtryckning | 2025-01-14 | 5 |
| **Skäretvägen** | **2025-01-14** | **99** |
| Huvudledning | 2025-01-14 | 49 |
| Stickvägar 1-8 | 2025-03-22 | 44 |
| Provtryckning | 2025-05-30 | 5 |
| **Åkerö Västergården södra** | **2025-06-09** | **94** |
| Huvudledning | 2025-06-09 | 55 |
| Stickvägar 1-3 | 2025-09-20 | 35 |
| Provtryckning / Vattenprov | 2025-11-10 | 4 |
| **Åkeröbyväg västra 450-900** | **2025-11-08** | **67** |
| Huvudledning | 2025-11-08 | 57 |
| Stickväg 3 | 2026-02-16 | 5 |
| Provtryckning / Vattenprov | 2026-02-23 | 5 |
| **Team 3** | **2024-10-11** | **41** |
| **Nordbergsvägen** | **2024-10-11** | **41** |
| Huvudledning | 2024-10-11 | 31 |
| Stickvägar | 2024-11-25 | 10 |
| **Hammarborrning** | **2024-11-18** | **15** |

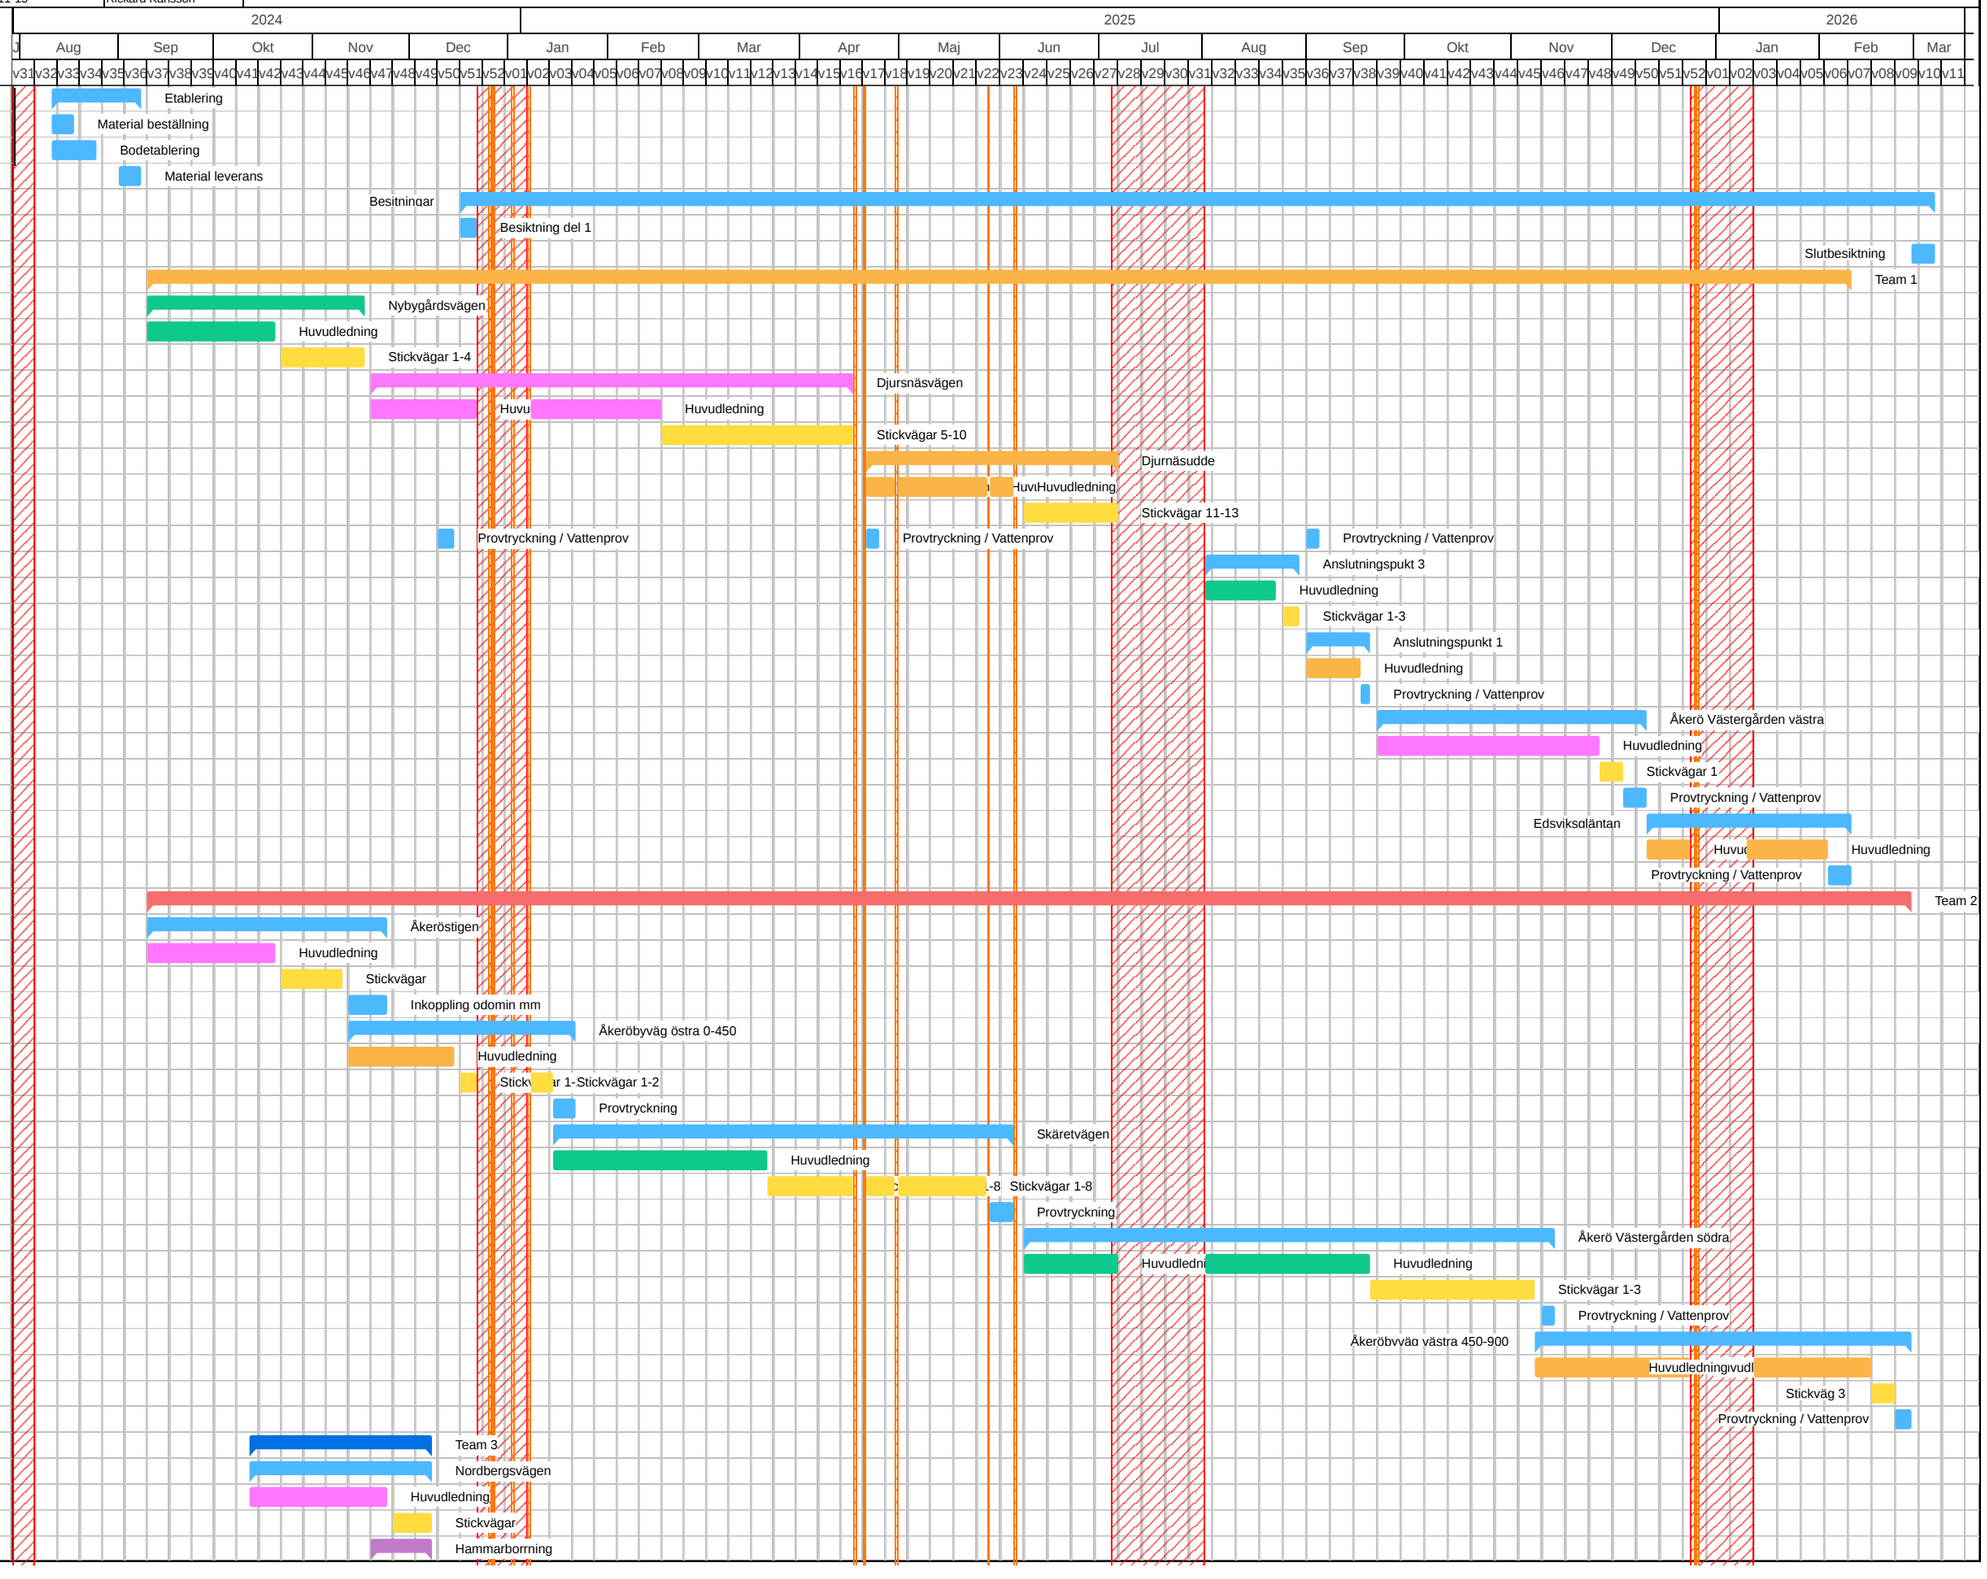

**KARLSSONS**
**Schakt & Transport**

| Projekt | | |
|---|---|---|
| Allmäna Åkerö Vo -15/11-24 | | |
| Utfärdad | Reviderad | Ansvarig |
| 2024-09-02 | 2024-11-15 | Rickard Karlsson |

Aktiviteter

| Aktivitet | Start | Bd |
|---|---|---|
| Anslutningspunkt 4 | 2024-11-18 | 5 |
| Anslutningspukt 3 | 2024-11-25 | 5 |
| Anslutningspukt 1 | 2024-12-02 | 5 |
| **Avetablering** | **2026-01-12** | **35** |
| Slutstädning | 2026-01-12 | 35 |
